Trintella IV

Baunummer: 700

La Paloma – DHPI

Teak-deck Überholung




1. Nach immerhin ca. 45 Jahren war das Teak-deck von La Paloma in einem Teilweise sehr schlechtem Zustand. Außerdem war es an vielen Schrauben undicht wenn der erste Regen in der Karibik nachhaltig einsetzte. Darum entschieden wir uns das Teak-Deck zu entfernen und das Deck neu zu gestalten. Da wir in Guatemala in Rio Dulce waren und es dort doch insgesamt qualifizierte Arbeitskräfte gab und die Preise sich in Grenzen hielten, entschieden wir uns die Arbeit anzugehen.

Ersteinmal musste das Teak-deck entfernt werden. Das war eine aufwendige Geschichte. Danach wurden alle Schraubenlöcher mit Epoxyd verschlossen. Danach das gesamte Deck mit zwei Matten überzogen.





Das Deck fertig für die Laminierung

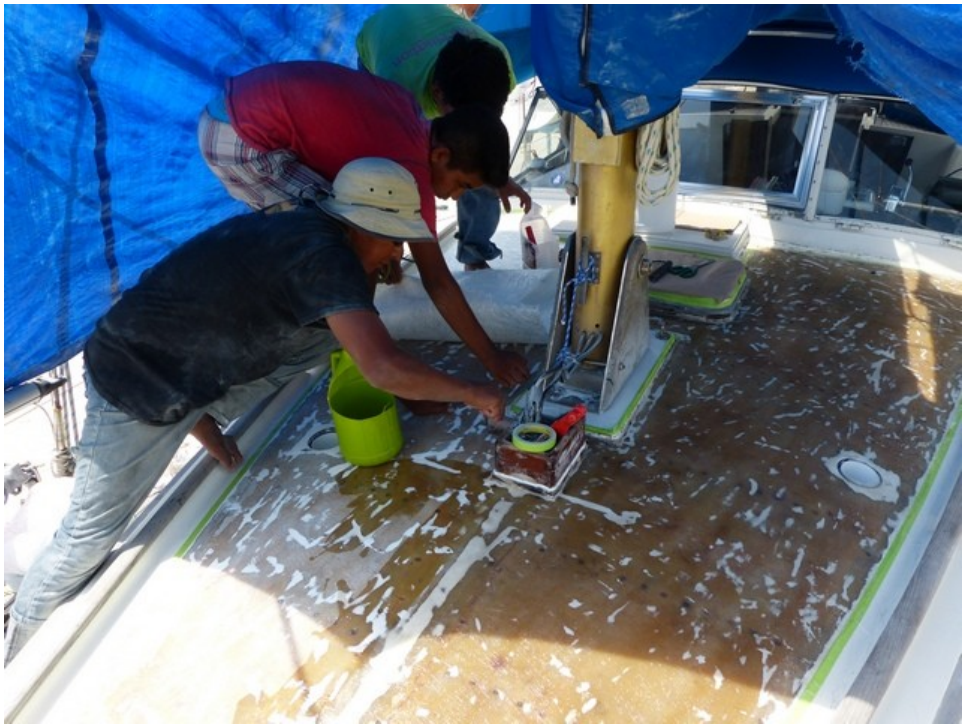

Die erste Matte wird aufgebracht



Die zweite Lage Matte wird aufgebracht

Wir haben die Antirutsch-Platten selbst angefertigt. Auf einer gewachsten Negativform mit Antirutschprofil wurden 2 Lagen Gel-Coat aufgespritzt und dann 2 Lagen Fiberglas-matte aufgebracht. Nach der Aushärtung wurde die Platte nach Muster ausgeschnitten und danach in einem Epoxyspachtel-Bett aufgeklebt.



Spachtelmasse wird aufgebracht







Alle Decks-Durchbrüche für die Doradelüfter wurden auf einer Plattform über das Deck erhöht, damit keine Schrauben zur Befestigung in das Deck gelangen. So wird verhindert das wieder Undichtigkeiten entstehen können.



Die Plattformen für die Doradelüfter und das Signal-Horn



So sieht das Deck nach der Lackierung aus. Auch die Festmacherklampen wurden auf eine Plattform montiert. So wird verhindert das Wasser eindringt.

Das haben wir auch auf dem Achterdeck gemacht, sodass das komplette Deck jetzt einheitlich aussieht.
